


# 建設現場でのヒヤリハット事例

バックホウが敷鉄板の上で移動した時に、敷鉄板がズレて足に当たりそうになった

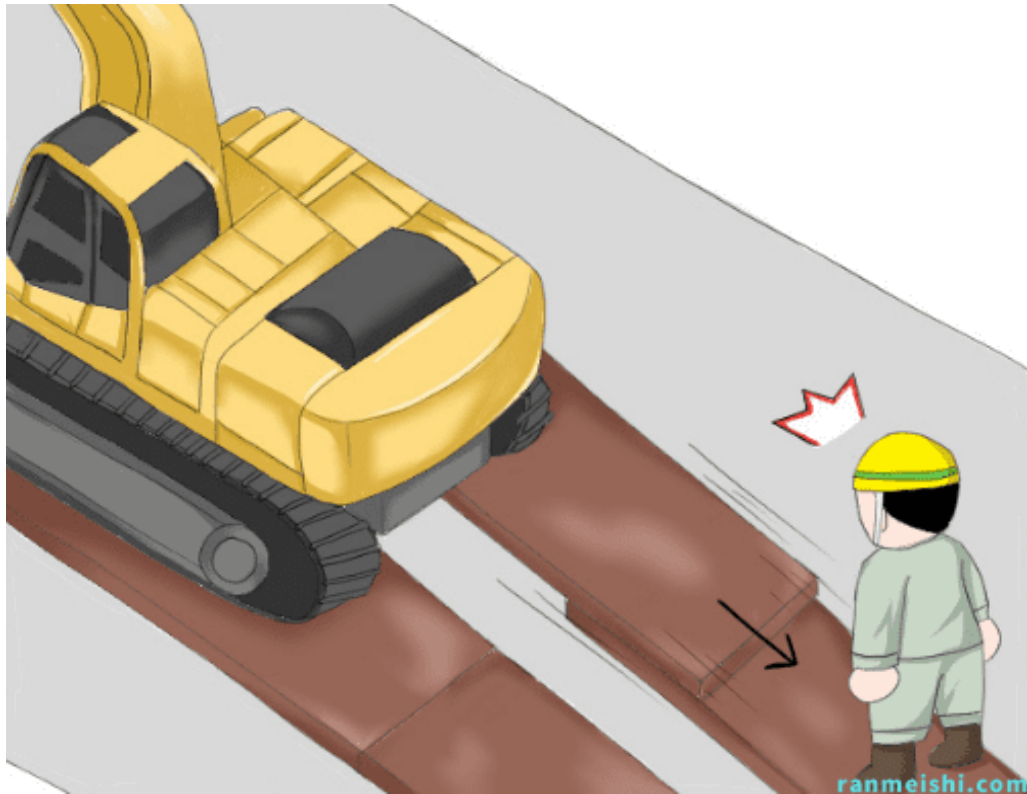

| 原因  | 対策   |
|---|--|
| <p>重機のキャタピラが、ズレやすい敷鉄板の端部で移動した。</p> <p>敷鉄板の固定をしていなかった。</p> | <p>重機の作業区域は立入禁止にする。</p> <p>隣り合う敷鉄板は溶接して固定する。</p> <p>固定金具により敷鉄板を固定する。</p> |
